



Entrega 5

Costes - Curva S

DESCRIPCION

Una vez ya cubiertos en las entregas anteriores los temas relacionados con alcance y tiempo, podemos empezar ahora de Costes. Una típica restricción de nuestro proyecto será el presupuesto que tiene asignado.

Las tareas a realizar en el apartado de costos se pueden desglosar:

- **Planificar la gestión de Costos:** En este punto es importante pensar en todos los costes que nuestro proyecto va a tener sin dejarse ninguno en este punto puede resultar de ayuda este mapa de costes posibles
- **Estimar los costes :** Para estimar los costes se pueden utilizar estas técnicas

1. Por analogía: Comparar con otro proyecto ya realizado de características similares.

asignar una cantidad de tiempo a cada una y luego multiplicar por el número de veces que se repetirá en el proyecto


3. Ascendente: En este tipo de estimación utilizamos el desglose de tareas que hemos hecho en el EDT o WBS, y asignamos un coste a cada una de las tareas, sumándolas todas tendremos la estimación del coste del Proyecto.

- **Controlar el coste.** Durante la ejecución del proyecto debemos controlar los costes y compararlos con los costes reales. Para este control proponemos una herramienta : La curva de uso de recursos o curva S corresponde a la representación gráfica del presupuesto de gastos programados a lo largo del proyecto, y nos permite por un lado entender el comportamiento del flujo de recursos y, por otro, nos sirve como medida de avance respecto al o los productos que se reciben fruto de la ejecución del proyecto. Si la comparamos con la curva de los gastos reales, nos ayuda a apreciar de manera gráfica la variación de costos del proyecto entre lo planificado y lo realmente gastado.

Mapa de Costes



Precisión Estimacion

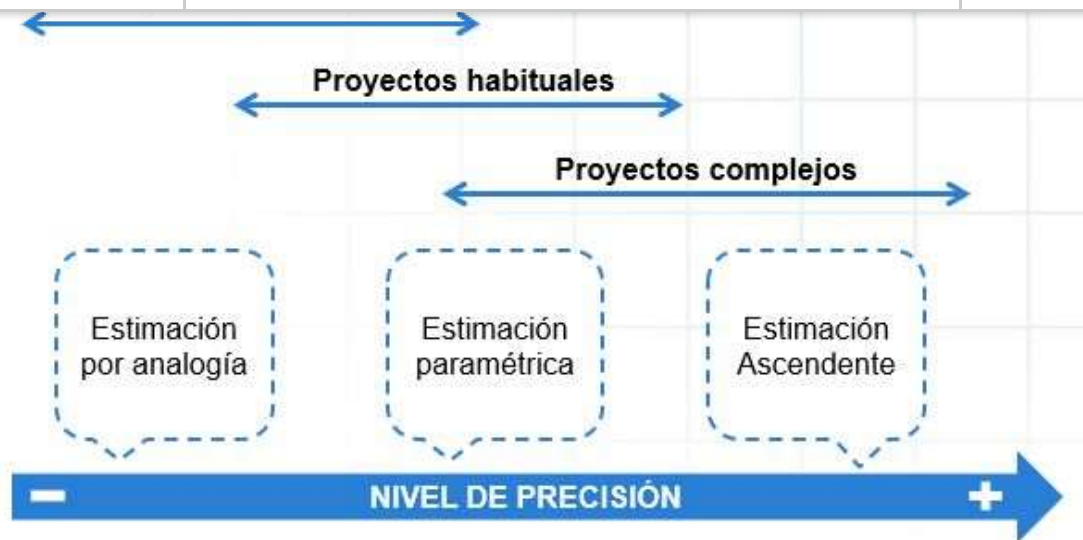

Presupuesto del Proyecto



EJEMPLO HERRAMIENTAS GRAFICAS CRONOGRAMA

VIDEO

Para entender mejor la curva S puedes ver el siguiente video :

<https://www.youtube.com/watch?v=L31AFFKQjYc>

En este enlace encontrarás una plantilla para construir tu Curva S

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VwxkvHsFkbzKQ_kWLgjoApOdv1aJ7n5V?rtpof=true&authuser=jmunozsa%40gmail.com&usp=drive_fs

CONTACTO Y ENTREGAS ANTERIORES

Puedes contactar con nosotros para cualquier duda o sugerencia en:

info@pmi-impactosocial.org indicando en el tema : PREGUNTA o SUGERENCIA

Entregas Anteriores : En meses precedentes hemos enviado :

- Entrega 1 – Acta de Constitución : Agosto 2022
- Entrega 2 – Matriz resultados : Septiembre 2022
- Entrega 3 - Estructura Detallada de Trabajo (EDT) - Octubre 2022
- Entrega 4 - Cronograma – Noviembre 2022

Ya tenemos en marcha la nueva web donde podrás encontrar las entregas previas en la pestaña Entregas.

La web de la iniciativa es <https://pmi-impactosocial.org/>

ENCUESTA

Gracias a los que ya habéis enviado vuestra opinión en la encuesta que enviamos.

Si no lo has hecho todavía, aun estas a tiempo de hacerlo a través del

enlace: <https://forms.gle/mJ3TSpWQsnp7Kszw6>

que propengamos se adapten mejor a vuestras
necesidades

Copyright © 2023 Proyectos Impacto Social 2022, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Grow your business with  mailchimp
